



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

Oggetto: Lavori di sistemazione a cura del Comune di Nocera Inferiore, inizio attività di prima, seconda e terza fase con la realizzazione di una rotatoria e di un parcheggio interscambio che prevedono la limitazione della rampa di ingresso e della parte terminale delle rampe di uscita su Via Atzori.

ORDINANZA N. 063/2024

Il sottoscritto Ing. Gerardo Capezuto, nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio della Salerno Pompei Napoli

PREMESSO

- Che la scrivente Concessionaria ed il Comune di Nocera Inferiore, in data 24/01/2023, hanno sottoscritto un atto Convenzionale, approvato dal Concedente Ministero delle Infrastrutture in data 23/07/2023 con Decreto Dirigenziale n. 256, per la disciplina dei rapporti relativi alla realizzazione e futura gestione, a cura del Comune di Nocera Inferiore, di una rotatoria di collegamento tra l'A3 e la stessa Città di Nocera.
- Che in data 15 dicembre 2023, il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di modificare la parte terminale della segnaletica posta in uscita allo svincolo di Nocera Inferiore per consentire al Comune l'esecuzione della Seconda fase dei lavori in oggetto per una durata presunta di 100 giorni.
- A tal fine sono state emesse le Ordinanze SPN 93/2023 128/2023.e 552/2024.
- In data 03/05/2023 il Direttore dei lavori Ing. Felice Campobasso incaricato dal Comune di Nocera Inferiore ha comunicato che l'attuale cantierizzazione sarà in essere fino al 17 maggio, per poi essere modificata con tre fasi di lavoro, con una durata, per singola fase di 10 giorni, che instraderanno il traffico progressivamente nella configurazione finale. L'installazione della cantieristica di prima fase necessita della chiusura dello svincolo di Nocera Inferiore in ingresso e in uscita, in orario notturno, tra il 17 e il 18 maggio.
- La nuova configurazione della rampa di uscita/entrata dello svincolo di Nocera Inferiore e della prima, seconda e terza fase dei lavori, è rappresentata dalla planimetria allegata alla presente. Tali configurazioni di cantiere avranno una durata complessiva di 30 giorni.
- Che le attività sono eseguite dall'impresa affidataria ed esecutrice Felco Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Viale delle Filande s.n.c lotto n°77-Area PIP cap 84087 Sarno (SA) P.Iva 04669431217. Il POS, presentato in data 23/11/2022, è stato approvato dal CSE in data 05/12/2022. La stessa impresa si occuperà anche della installazione della segnaletica stradale, in ingresso all'A3 dalla città di Nocera.
- Che la segnaletica è installata in conformità allo schema grafico allegato alla presente.

VISTO

- il Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6



SALERNO POMPEI NAPOLI S.p.A.

Capitale Sociale € 130.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a.

comma 4, che conferisce all'Ente proprietario o Concessionario della strada, la facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;

- il Regolamento di Esecuzione del suddetto D. Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Tutto quanto sopra con la presente, lo scrivente al fine di consentire al Comune di Nocera Inferiore l'attuazione delle cantierizzazioni necessarie alla esecuzione della rotatoria in argomento

ORDINA

- Dalle ore 22:00 del giorno 17 maggio 2024 alle ore 06:00 del giorno 18 maggio 2024 la chiusura in entrata e in uscita dello svincolo di Nocera Inferiore;

Gli utenti che da Nocera Inferiore sono diretti in A3, in direzione Nord (Napoli), potranno entrare in autostrada dallo svincolo di Angri Sud, mentre quelli diretti a Sud in direzione Salerno, potranno entrare in A3 dallo svincolo di Cava de' Tirreni.

- Dalle ore 06:00 del giorno 18 maggio e per una durata complessiva di 30 giorni lavorativi, fino al 28 giugno 2024 la limitazione della rampa di ingresso/uscita dello svincolo di Nocera Inferiore in conformità alla planimetria allegata alla presente per l'esecuzione delle tre fasi di lavoro.

Si raccomanda agli utenti in ingresso e/o in uscita a Nocera Inferiore in tale periodo di prestare la massima attenzione.


È fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente Ordinanza.

Il presente Atto è trasmesso ai soggetti interessati, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e al Compartimento di Polizia Stradale della Campania e del Molise.


IL Direttore Dell' Esercizio
(Ing. Gerardo Capezzuto)

All: c.s.

STATO ATTUALE

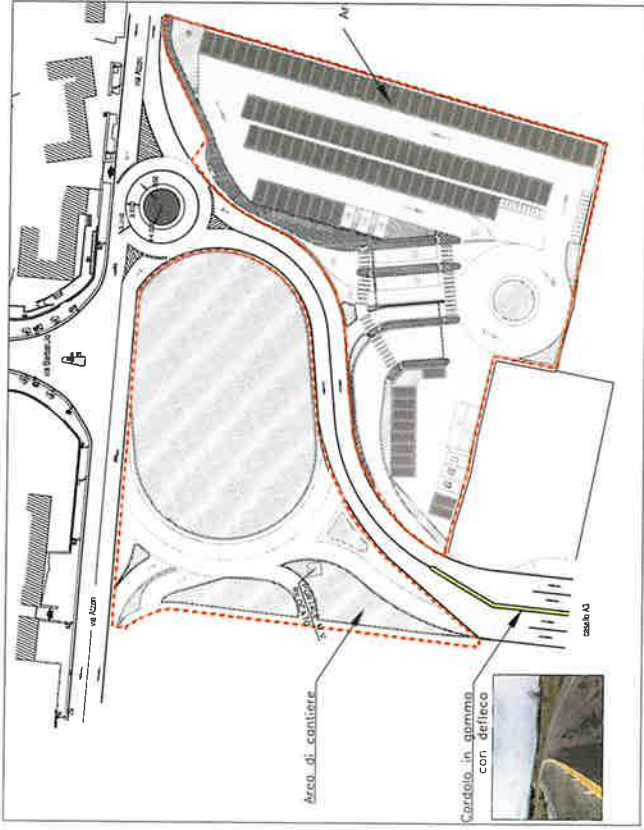

FASE 1

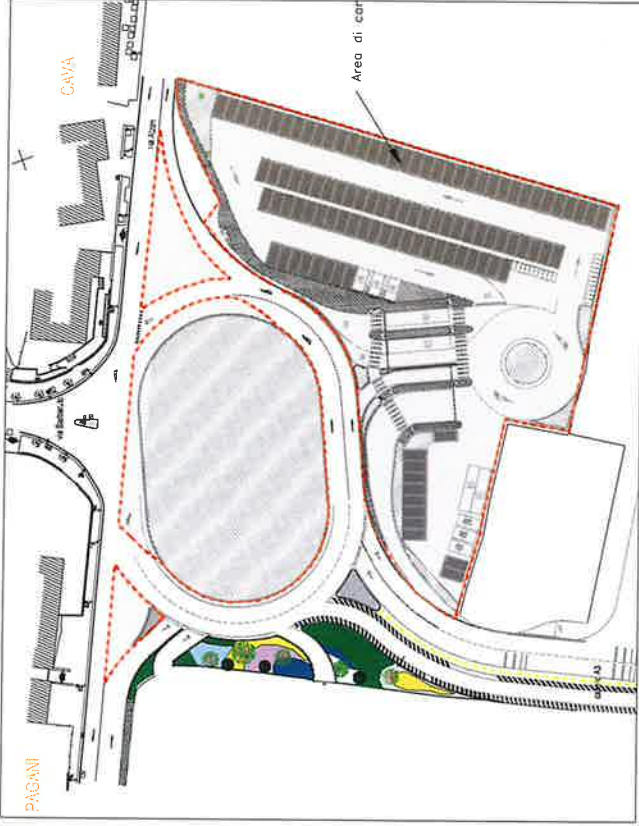

FASE 2



FASE 3

